

第 9 回

大仙市優良建設工事表彰



大 仙 市

平成 28 年 6 月 29 日

第9回大仙市優良建設工事表彰者一覧

No.	工事名	工事場所	請負業者	代表者名
				現場技術者
1	(建都0006) 社工補26-02 都市計画道路中通線道路新設工事	大仙市大花町地内	秋田振興建設株式会社	小原 将司郎
				深谷 篤志
2	(下水0002) 第3402号 公共下水道整備工事 (大曲処理区)	大仙市幸町地内	高禮建設株式会社	安宅 信之
				戸嶋 義文
3	(建都0001) 社工補27-01 ねむのき公園整備工事	大仙市大曲通町地内	株式会社宮原組	宮原 竜也
				加藤 武夫
4	(建土0004) 通町線消雪設備整備工事	大仙市大曲中通町・ 大曲丸の内町地内	株式会社朝日水道工業所	遠田 博士
				千葉 和彦
5	(建道0017) 道交一第2号 市役所前通線歩道無散水融雪工事	大仙市大曲栄町地内	株式会社佐々木組南支店	佐々木 英則
				藤田 基
6	(神農建0003) 第270202号 公共下水道整備工事 (神岡処理区)	大仙市神宮寺字大浦地内	株式会社小笠原組	小笠原 武男
				大山 雄幸
7	(農農0006) ふれあいの森整備事業姫神公園整備工事	大仙市花館字松山地内	秋南電気土木株式会社	高橋 俊悦
				高橋 正浩
8	(協農建0012) 協和南部地区簡易水道半仙地区国道推進工事	大仙市協和峰吉川字 半仙地内	進藤建設株式会社	進藤 章
				加藤 学
9	(建道0009) 橋補修交一第1号 坂の上橋橋梁補修工事	大仙市豊川字坂ノ上川端 地内	高三建設株式会社	高橋 篤美
				後藤 匡育
10	(下水0012) 第3405号 公共下水道整備工事 (大曲処理区)	大仙市大花町・幸町地内	有限会社県南開発工業	高橋 勲
				佐々木 智士
11	(建築0033) 受2733 神岡児童クラブ移転新築工事	大仙市神宮寺字 神宮寺53-4他	株式会社丸茂組	三浦 尚
				佐藤 文司郎
12	(建土0013) 補2608 都市計画道路まるこ川通線新設工事	大仙市大曲中通町・ 大曲丸の内町地内	荒屋鋪建設・高倉工業 特定建設工事共同企業体	(株)荒屋鋪建設 今野 春夫 佐藤 保
				高倉工業(株) 高橋 日出男 伊藤 剛

※大仙市優良建設工事請負業者等表彰要綱による。

第 9 回 大 仙 市 優 良 建 設 工 事 表 彰

工 事 名 : (建都0006) 土工補26-02 都市計画道路中通線道路新設工事

施 工 場 所 : 大仙市大花町地内

請 負 業 者 : 大仙市大曲西根字嶋村60番地

秋田振興建設株式会社

代表取締役 小原 将司郎 ・ 主任技術者 深谷 篤志

請 負 額 : 78,576,480 円

工 期 : 平成26年8月8日 ～ 平成27年5月22日

推 薦 部 局 所 : 建設部都市管理課

監 督 員 : 課長 小田原大造 ・ 主席主査 高橋晃太郎 ・ 技師 戸澤達洋

工 事 概 要 : 都市計画道路中通線 L=192.0m 道路土工 N=1式

地盤改良工(置換工) V=1,700m³

排水構造物工 N=1式(可変勾配側溝、円形側溝、集水桝等)

下層路盤工 t=250mm A=2,030m²

道路付属施設工 N=1式(縁石工、標識工、照明工、消融雪設備等)

受賞者からのコメント

この度は、優良建設工事表彰の栄誉を賜り、誠にありがとうございました。温かいご指導を頂きました監督員、関係者の皆様、さらにはこの工事にご理解とご協力を頂きました地域住民の方々に心より感謝申し上げます。

今後もこの受賞を励みとし、安全を最優先に施工管理の向上に努めるとともに、地域の皆様に貢献できるよう努力して参りたいと思います。



代表取締役
小原 将司郎



主任技術者
深谷 篤志

表彰理由

本工事は大曲駅周辺を外環する道路の新設工事である。工事区域内において上下水道管新設、電気、電話線などライフラインの接続工事等、多くの関連工事がある中、安全協議会を設立し、工程調整を行いながら円滑な施工に努め、完成に至った。また、近隣住民や環境に配慮し工事区域周辺の清掃美化活動を実施した。交通開放時は自社提案により、仮舗装を行い防塵処理を行うとともに誘導看板を適正に設置し、通行車両の誘導をスムーズに行うなど、品質・出来ばえはもとより安全対策や地域住民等への配慮など優良な工事である。



完成写真



路盤工施工状況

第 9 回 大 仙 市 優 良 建 設 工 事 表 彰

工 事 名 : (下水0002) 第3402号 公共下水道整備工事

施 工 場 所 : 大仙市幸町地内

請 負 業 者 : 大仙市太田町齊内字高野1番地434

高禮建設株式会社

代表取締役 安宅 信之 ・ 主任技術者 戸嶋 義文

請 負 額 : 37,153,080 円

工 期 : 平成27年5月1日 ～ 平成27年9月4日

推 薦 部 局 所 : 上下水道部下水道課

監 督 員 : 課長 五十嵐直樹 ・ 参事 佐藤恭悦 ・ 主任 齋藤今日子

工 事 概 要 : 管路施工延長 L=254.6m
リブ付塩ビ管布設工 L=216.9m 塩ビ管布設工 L=32.5m
マンホール工1号N=5箇所 マンホール工0号N=1箇所
取付管及びます工 N=20箇所
付帯工 道路復旧工 N=1式

受賞者からのコメント

この度は優良工事表彰を賜り、誠に有難うございます。
当工事は住宅密集地で、施工中は通行止めでの作業であり、発注関係機関の皆様及び地域住民の皆様のご指導ご協力のおかげで工事を無事完成することが出来ました。

本受賞を励みに、地域の皆様のニーズに応えられるよう、今後ともご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。



代表取締役
安宅 信之



主任技術者
戸嶋 義文

表彰理由

本工事は市街地生活道路における公共下水道管渠埋設工事である。開発行為による宅地造成工事が隣接しており同時施工であったが、連絡・調整を積極的に行うとともに創意工夫を持って安全対策に取り組み、円滑に工事を完成させた。現場周辺では率先して側溝清掃等のクリーンアップ活動に取り組んだほか、近隣の塀や車庫への小石・泥・乳剤等の付着防止のためマット・シート保護対策を行い影響を最小限にとどめた。

良好な施工体制のもと、施工管理、工程管理及び安全管理が適切かつ確実に行われ、出来形、品質ともに優れた工事である。



完成写真



推進工法

第 9 回 大 仙 市 優 良 建 設 工 事 表 彰

工 事 名 : (建都0001) 社工補27-01 ねむのき公園整備工事

施 工 場 所 : 大仙市大曲通町地内

請 負 業 者 : 大仙市神宮寺字家後18番地の2

株式会社宮原組

代表取締役 宮原 竜也 ・ 主任技術者 加藤 武夫

請 負 額 : 19,360,080 円

工 期 : 平成27年7月16日 ～ 平成27年10月2日

推 薦 部 局 所 : 建設部都市管理課

監 督 員 : 課長 小田原大造 ・ 主席主査 高橋晃太郎 ・ 技師 戸澤達洋

工 事 概 要 : 芝生整備工(芝生撤去工 A=740㎡、芝生整備工 A=690㎡)

境界工 歩車道境界ブロック L=256m

園路舗装工(表層工 A=211㎡、下層路盤工 A=34㎡)

植樹・剪定工 N=1式

遊具等整備工 N=1式

付帯設備工 N=1式

受賞者からのコメント

この度の受賞にあたり、関係各位並びに施工にご協力いただいた地域の皆様に心より感謝申し上げます。市民生活に安らぎと潤いをもたらす公園整備工事において高い評価をいただいた事は光栄の至りであります。

今後も公共事業の安全性・信頼性を更に高めるため、更なる研鑽を重ね、地域社会発展の一翼を担えるよう努力していく所存でございます。



代表取締役
宮原 竜也



主任技術者
加藤 武夫

表彰理由

本工事は、大曲厚生医療センターに隣接するねむのき公園の再整備を行う工事である。再開発事業の完了に合わせた工事完成を求められるとともに、公園内では照明灯の更新や管理棟の新築等、他の工事も同時に施工しなければならず、綿密な工程調整や工程管理が求められた。

施工箇所が大曲駅に近く、地域住民や観光客・買い物客等が多い商業地であることから、公園周辺の清掃や公園内の草刈りを積極的に行い、更に仮囲いに大曲の花火の写真を貼付し通行者へPRするなど、品質・出来ばえはもとより安全対策や地域住民等への配慮など地域貢献の観点からも評価できるものである。



完成写真



舗設状況

第 9 回 大 仙 市 優 良 建 設 工 事 表 彰

工 事 名 : (建土0004) 通町線消雪設備整備工事

施 工 場 所 : 大仙市大曲中通町・大曲丸の内町地内

請 負 業 者 : 大仙市大曲須和町一丁目3番58号

株式会社朝日水道工業所

代表取締役 遠田 博士 ・ 主任技術者 千葉 和彦

請 負 額 : 12,744,000 円

工 期 : 平成27年8月7日 ～ 平成27年11月6日

推 薦 部 局 所 : 建設部土地区画整理事務所

監 督 員 : 所長 吉野一利 ・ 参事 矢野良和 ・ 主査 佐々木博央

工 事 概 要 : 散水加工管 L=229.2m

水源取出工 N=1式

送水管敷設工 N=1式

受賞者からのコメント

この度大仙市優良建設工事という栄誉ある賞を受けることとなり、身の引き締まる思いをしております。工事に対し深いご理解を下さいました近隣の皆様や、協力業者をはじめとする関係各位、そして隣接現場として色々と相談に乗っていただきました鹿島建設・戸田JVの皆様 に心より感謝いたします。

これを機に、いっそう精進し、地域社会に貢献して参りたいと思います。誠にありがとうございました。



代表取締役
遠田 博士



主任技術者
千葉 和彦

表彰理由

本工事は、大曲地域の生活道路における消雪管敷設工事である。施工箇所は、大曲通町地区第一種市街地開発事業南街区施設建築工事の竣工に合わせ一部完成しなければならない工程制限のある中、現場条件に配慮し散水管現場加工を承認により二次製品を使用するなど、積極的に施工性の向上と工期短縮に取り組み、無事故、無災害かつ円滑に工事を完成させた。

良好な施工体制のもと、施工管理、工程管理及び安全管理が適切かつ確実に行われ、出来形、品質ともに優れた工事である。



完成写真



二次製品布設状況

第 9 回 大 仙 市 優 良 建 設 工 事 表 彰

工 事 名 : (建道 0 0 1 7) 道交一第 2 号 市役所前通線歩道無散水融雪工事

施 工 場 所 : 大仙市大曲栄町地内

請 負 業 者 : 大仙市大曲栄町 6 番 2 6 号

株式会社佐々木組 南支店

常務取締役支店長 佐々木 英則 ・ 主任技術者 藤田 基

請 負 額 : 23,696,280 円

工 期 : 平成27年9月4日 ～ 平成27年11月30日

推 薦 部 局 所 : 建設部道路河川課

監 督 員 : 次長 進藤孝雄 ・ 副主幹 高橋完 ・ 主査 川村聡

工 事 概 要 : 融雪延長 L=105m
融雪面積 A=286m²
注入設備工 N=1式
無散水融雪設備工 N=1式
アスファルト舗装工 N=1式

受賞者からのコメント

この度は、栄誉ある大仙市優良建設工事表彰を賜り誠にありがとうございます。ご指導頂きました発注者の皆様、ご協力頂きました地域住民並びに関係各位の皆様には、心より感謝と御礼を申し上げます。市民等の方々が、冬期間に少しでも快適に通行できる工事に携われた事を光栄の至りに存じます。

今後も、弊社一丸となって品質・技術力の向上に一層努力する所存でございますので、ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。



常務取締役支店長
佐々木 英則



主任技術者
藤田 基

表彰理由

本工事は、市役所前通線の歩道部へ無散水融雪施設を設置し、冬期における歩行者空間を確保する工事である。施工箇所は、学校や公共施設等、通勤通学及び日常生活に密接した路線であり、利用者が多く歩行者への配慮が重視される工事であった。

受注者は、関係機関等への周知を徹底し、交通誘導員・仮設歩道・看板等の充実した配置を積極的に行った。また、地域行事の際は工事を休止するなど地域住民に配慮しながら、安全な通行と品質の確保・住民対策に努め、工事全般にわたり評価できる優良な工事である。



完成写真



融雪配管

第 9 回 大 仙 市 優 良 建 設 工 事 表 彰

工 事 名 : (神農建0003) 第270202号 公共下水道整備工事

施 工 場 所 : 大仙市神宮寺字大浦地内

請 負 業 者 : 大仙市神宮寺字愛宕下22番地の4

株式会社小笠原組

代表取締役 小笠原 武男 ・ 主任技術者 大山 雄幸

請 負 額 : 54,961,200 円

工 期 : 平成27年7月3日 ～ 平成27年12月11日

推 薦 部 局 所 : 神岡支所農林建設課

監 督 員 : 課長 藤井一博 ・ 副主幹 古屋和久 ・ 主任 田口政樹

工 事 概 要 : 管渠築造工 L=401.8m
リブ付塩ビ管布設工 L=190.0m
下水道用ポリエチレン管布設工 L=98.6m
組立式1号マンホール N=9箇所
取付管及びます工 N=3箇所 付帯工 N=1式
硬質塩化ビニル管推進 L=104.1m

受賞者からのコメント

この度は、榮譽ある大仙市優良建設工事表彰を賜り誠にありがとうございます。本工事は想定以上の軟弱層や多量の湧水があり、これらに対処する為、試掘や試験施工に多くの時間を費やし難航した現場でありましたが、発注者様並びに地域住民のご協力により無事故無災害で完工させる事ができ、心より感謝申し上げます。

今後ともご指導の程、よろしくお願い申し上げます。



代表取締役
小笠原 武男



主任技術者
大山 雄幸


表彰理由

本工事は、神宮寺大浦地区の公共下水道管渠埋設工事である。受注者は当初開削工法で発注された箇所において土質条件の変更に伴い推進工法へ対応を迅速に行い、工期に余裕を持って工事を完成させた。

また、周辺住民とのコミュニケーションを密にとり、ボランティア活動を行うなど、公共工事のイメージ向上に寄与しており、現場及び施工管理資料からも丁寧な施工が確認できるなど、品質、出来ばえとも高く評価できる優良な工事である。



完成写真

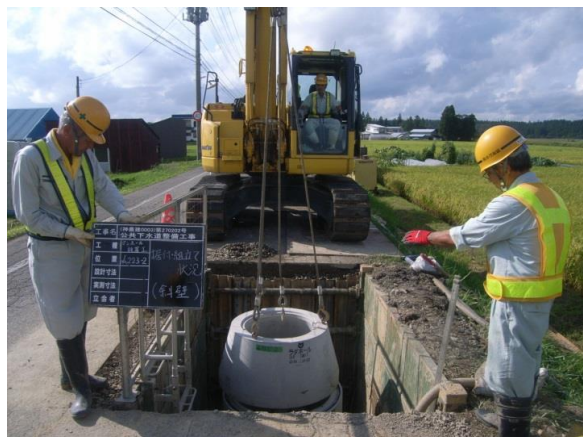

マンホール立込状況

第 9 回 大 仙 市 優 良 建 設 工 事 表 彰

工 事 名 : (農農0006) ふれあいの森整備事業姫神公園整備工事

施 工 場 所 : 大仙市花館字松山地内

請 負 業 者 : 大仙市大曲福見町3番15号

秋南電気土木株式会社

代表取締役 高橋 俊悦 ・ 主任技術者 高橋 正浩

請 負 額 : 6,990,840 円

工 期 : 平成27年9月18日 ～ 平成27年12月11日

推 薦 部 局 所 : 農林商工部農林振興課

監 督 員 : 次長 田中盛耕 ・ 主席主査 佐々木直樹 ・ 主査 高橋朋之

工 事 概 要 : 路網整備(遊歩道)5路線 L=224.60m

階段工 181段

ベンチ 7基

案内板 1基

受賞者からのコメント

この度は、大仙市優良建設工事表彰の栄誉を賜り誠にありがとうございます。また、本工事完成に至るまでに御指導頂きました監督員の皆様、御協力頂きました関係者の皆様、公園利用者の皆様にも心より感謝と御礼申し上げます。今後もこの栄誉を励みに、地域、社会に貢献できるように自己研鑽に努めて参りますので、御指導の程 よろしくお願い致します。



代表取締役
高橋 俊悦



主任技術者
高橋 正浩

表彰理由

本工事は姫神公園の遊歩道を主とした整備工事である。受注者は、起伏が激しく作業条件の悪い中、公園利用者の安全確保に配慮するなど様々な工夫を行い、適切な工事管理により工事を完成させた。

また管理資料から、杭頭防護キャップを使用するなど丁寧な施工が確認できるほか、景観・出来栄等に評価の高い優良工事である。



完成写真



防護キャップ

第 9 回 大 仙 市 優 良 建 設 工 事 表 彰

工 事 名 : (協農建 0 0 1 2) 協和南部地区簡易水道半仙地区国道推進工事

施 工 場 所 : 大仙市協和峰吉川字半仙地内

請 負 業 者 : 大仙市協和峰吉川字半仙 8 6 番地の 2

進藤建設株式会社

代表取締役 進藤 章 ・ 主任技術者 加藤 学

請 負 額 : 11,653,200 円

工 期 : 平成27年10月2日 ～ 平成27年11月30日

推 薦 部 局 所 : 協和支所農林建設課

監 督 員 : 課長 阿部慶彦 ・ 主席主査 加藤重則 ・ 主席主査 時田浩太

工 事 概 要 : 推進工 L=34.3m
立坑工 ライフプレート円形 H=3.0m
既設配管接続工 水道配水用ポリエチレン管 L=39.9m
仮設配管撤去工 L=143.0m×2条
既設管閉塞工 セメントミルク注入 L=70.0m
路面復旧工 A=68.0m²

受賞者からのコメント

この度は、榮譽ある大仙市優良建設工事表彰を賜り有り難うございます。ご指導頂きました発注者や関係各位の皆様、地域住民のご協力により無事故無災害で工事を完成させることができた心より感謝申し上げます。早期に水道を復旧すべく全社挙げて工事を行いました。

今後とも安全に配慮し地域社会に貢献できるよう努力して参りますので、ご指導賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役
進藤 章



主任技術者
加藤 学

表彰理由

本工事は、一般国道13号を横断する簡易水道推進工事である。施工中の立坑に合わせた防護柵を設置し工事関係者及び第三者の転落防止に努めるなど、安全確保に万全を期した。また、推進作業中の汚泥水処理に沈殿槽を設置し、濾過した処理水を放流するなど環境に配慮し円滑に工事を完成させた。

良好な施工体制のもと、工程管理及び施工管理が適切かつ迅速に行われ出来形、品質ともに優れた工事である。



鋼管推進完了



鋼管推進状況

第 9 回 大 仙 市 優 良 建 設 工 事 表 彰

工 事 名 : (建道 0 0 0 9) 橋補修交一第 1 号 坂の上橋橋梁補修工事

施 工 場 所 : 大仙市豊川字坂ノ上川端地内

請 負 業 者 : 大仙市長野字新山 9 2 番地 1

高三建設株式会社

代表取締役 高橋 篤美 ・ 主任技術者 後藤 匡育

請 負 額 : 50,355,000 円

工 期 : 平成27年7月17日 ～ 平成27年12月11日

推 薦 部 局 所 : 中仙支所農林建設課

監 督 員 : 課長 佐藤吉一 ・ 参事 山田清 ・ 主席主査 佐藤彰

工 事 概 要 : 橋長 L=115.0m 有効幅員 W=7.0m
床版部分打換工 14m³ 橋梁地覆補修工 1式
支承防錆工 12基
アスファルト舗装工 A=870m²
伸縮装置止水工 1式
橋面防水工 A=800m²

受賞者からのコメント

本工事は、全面通行止め規制の施工であったため、工期を短縮し、いかに周辺住民への影響を少なくするかが課題の工事でした。

工期の短縮を図るため新しい工法を提案する等、様々な工夫を行いました。その結果が、この表彰を受賞できたと喜んでおります。

また次回も受賞できるよう、日々努力していきたいと思っております。



代表取締役
高橋 篤美



主任技術者
後藤 匡育

表彰理由

本工事は、市道中仙25号線に架かる坂の上橋の経年劣化、老朽化等に伴う損傷を修復し、機能を回復するための橋梁補修工事である。交通量が多い幹線市道の通行止め及び大雨による河川の増水等、厳しい条件の中、積極的に橋面防水、橋梁塗装等で施工性、耐久性に優れた新工法を採用し、条件克服に努め、技術的に優れた現場であった。

また、床版部分打換箇所において既存鉄筋の防錆塗装や生コン打設に工夫を凝らし品質向上を図り、その取り組みは模範的であり、出来形、品質ともに優れた工事である。



完成写真



防錆塗装

第 9 回 大 仙 市 優 良 建 設 工 事 表 彰

工 事 名 : (下水0012) 第3405号 公共下水道整備工事
施 工 場 所 : 大仙市大花町・幸町地内
請 負 業 者 : 大仙市大曲飯田町1番11号
有限会社県南開発工業
代表取締役 高橋 勲 ・ 主任技術者 佐々木 智士
請 負 額 : 31,008,960 円
工 期 : 平成27年9月11日 ～ 平成27年12月18日
推 薦 部 局 所 : 上下水道部下水道課
監 督 員 : 課長 五十嵐直樹 ・ 参事 佐藤恭悦 ・ 技師 柏谷知洋
工 事 概 要 : 管路施工延長 L=279.1m
管渠工 リブ付塩ビ管布設工 L=274.6m
マンホール工 1号マンホール設置工 N=5箇所
取付管及びます工 桝設置工 N=20箇所
付帯工 道路復旧工 N=1式

受賞者からのコメント

この度は大仙市優良工事表彰の栄誉を賜り、誠に有難うございます。

ご指導頂きました監督員ならびに関係各位の皆様には、厚く御礼申し上げます。また、地域住民の皆様からご協力を頂きました事、心より感謝いたしております。

社員一同、本受賞を今後の励みとし、更なる技術・品質の向上、安全施工を念頭に、地域社会に役立つ企業であるよう努めていきたいと思っております。



代表取締役
高橋 勲



主任技術者
佐々木 智士

表彰理由

本工事は、市街地生活道路における下水道管渠埋設工事である。開削工法で発注された施工区間について、消雪施設への影響を配慮し、推進工法を自ら提案し、自主施工するなど、積極的に施工性と品質確保の向上と安全対策に取り組み、無事故、無災害かつ円滑に工事を完成させた。

良好な施工体制のもと、施工管理及び安全管理が適切かつ確実に行われ、出来形、品質ともに優れた工事である。



完成写真



推進工法

第 9 回 大 仙 市 優 良 建 設 工 事 表 彰

工 事 名 : (建築 0033) 受 2733 神岡児童クラブ移転新築工事

施 工 場 所 : 大仙市神宮寺字神宮寺 53-4 他

請 負 業 者 : 大仙市花館字間倉 157 番地 6

株式会社丸茂組

代表取締役 三浦 尚 ・ 主任技術者 佐藤 文司郎

請 負 額 : 71,604,000 円

工 期 : 平成27年9月18日 ～ 平成28年3月11日

推 薦 部 局 所 : 建設部建築住宅課

監 督 員 : 課長 古屋利彦 ・ 主査 三浦将博 ・ 技師 木村勇輝

工 事 概 要 : 木造平屋建て

建築面積 A=334.40㎡

延床面積 A=280.94㎡

受賞者からのコメント

この度、優良工事表彰という高い評価を賜りましたことに対しまして、ご指導・ご協力頂いた関係各位に深く感謝申し上げます。

今後も、社員のスキルアップによる品質・安全の向上は元より、地域社会に受け入れていただける『気の利いた』会社を目指して参りたいと思います。

今後とも、ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。



代表取締役
三浦 尚



主任技術者
佐藤 文司郎

表彰理由

本工事は、神岡地域における放課後児童クラブの新築工事である。施工に際し、建築物の接合金物において受注者の提案により、性能基準の高い金物を使用し建物の耐震性を向上させるなど随所に工夫がみられた。また、周辺住民とコミュニケーションを図りトラブルもなく円滑に完成させた。

段階確認及び各種検査を的確に行い、品質、出来栄ともに評価できる優良な工事である。



完成写真



完成写真

第 9 回 大 仙 市 優 良 建 設 工 事 表 彰

工 事 名 : (建土0013) 補2608 都市計画道路まるこ川通線新設工事

施 工 場 所 : 大仙市大曲中通町・大曲丸の内町地内

請 負 業 者 : 大仙市花館字下殿屋敷9番地

荒屋舗建設・高倉工業特定建設工事共同企業体

代表者 株式会社荒屋舗建設

代表取締役 今野 春夫 ・ 監理技術者 佐藤 保

請 負 額 : 126,067,320 円

工 期 : 平成27年10月2日 ～ 平成28年3月25日

推 薦 部 局 所 : 建設部土地区画整理事務所

監 督 員 : 所長 吉野一利 ・ 主席主査 佐藤重仁 ・ 参事 矢野良和

工 事 概 要 : 施工延長 L=238.36m プレキャスト擁壁 L=108.0m

照明設置 N=7基

無散水消雪 A=437㎡

アスファルト舗装 A=1,005㎡ ブロック舗装 A=1,420㎡

擬木格子柵 L=248m

受賞者からのコメント

この度、栄誉ある大仙市優良建設工事表彰を賜り誠に有難うございます。また、工事を進める上で、迅速に対応・ご指導頂きました監督職員の皆様、ご協力頂きました地域住民ならびに近接工事業者の皆様のおかげであり深く感謝と御礼を申し上げます。

この受賞を励みに、今後も地域社会に貢献できる様、安全管理の徹底、品質・技術力向上に一層努力して参りますので、ご指導賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役
今野 春夫



監理技術者
佐藤 保

表彰理由

本工事は、大曲第二地区土地区画整理事業において、歩行者専用道路と河川に隣接した管理道路を一体的に整備するものである。歩行者専用道路部分については、無散水消雪化による冬期間の歩行空間の確保とともに、丸子川水辺空間、隣接する街区公園とともに一体感のある景観形成が求められた。冬期間の工事であったため、無散水消雪の放熱管の巻立コンクリートの品質確保が求められたが、養生小屋を設置し風雪や外気の影響を抑え、品質確保に努めた。

また、隣接する住宅地及び商業地並びに河川環境への対応が求められた施工地のため、騒音対策、河川環境対策、安全確保対策を実施するなど、品質・出来ばえはもとより地域住民への配慮など他の業者の模範となる工事である。



完成写真



養生小屋

第 9 回 大 仙 市 優 良 建 設 工 事 表 彰

工 事 名 : (建土0013) 補2608 都市計画道路まるこ川通線新設工事

施 工 場 所 : 大仙市大曲中通町・大曲丸の内町地内

請 負 業 者 : 大仙市花館字下殿屋敷9番地

荒屋舗建設・高倉工業特定建設工事共同企業体

構成員 高倉工業株式会社

代表取締役 高橋 日出男 ・ 主任技術者 伊藤 剛

請 負 額 : 126,067,320 円

工 期 : 平成27年10月2日 ～ 平成28年3月25日

推 薦 部 局 所 : 建設部土地区画整理事務所

監 督 員 : 所長 吉野一利 ・ 主席主査 佐藤重仁 ・ 参事 矢野良和

工 事 概 要 : 施工延長 L=238.36m プレキャスト擁壁 L=108.0m

照明設置 N=7基

無散水消雪 A=437m²

アスファルト舗装 A=1,005m² ブロック舗装 A=1,420m²

擬木格子柵 L=248m

受賞者からのコメント

この度は、栄えある大仙市優良建設工事表彰を賜り感謝申し上げますとともに、当工事に携わられたことを光栄に感じております。

発注関係者及び地域の方々のご指導、ご協力のもと、無事故無災害で完成でき厚くお礼申し上げます。

今後は、この受賞を励みとし一層の研鑽を重ね、地域の発展に寄与できますよう努力して参りたいと思います。



代表取締役
高橋 日出男



主任技術者
伊藤 剛

表彰理由

本工事は、大曲第二地区土地区画整理事業において、歩行者専用道路と河川に隣接した管理道路を一体的に整備するものである。歩行者専用道路部分については、無散水消雪化による冬期間の歩行空間の確保とともに、丸子川水辺空間、隣接する街区公園とともに一体感のある景観形成が求められた。冬期間の工事であったため、無散水消雪の放熱管の巻立コンクリートの品質確保が求められたが、養生小屋を設置し風雪や外気の影響を抑え、品質確保に努めた。

また、隣接する住宅地及び商業地並びに河川環境への対応が求められた施工地のため、騒音対策、河川環境対策、安全確保対策を実施するなど、品質・出来ばえはもとより地域住民への配慮など他の業者の模範となる工事である。



完成写真



養生小屋
